DGP

Dirección y Gestión de Proyectos



LOS GANTT-STERS

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL SPRINT 1

AGENSIBLE · AGENDA PERSONALIZADA ACCESIBLE

Versión 2 · Diagrama de Gantt y PERT corregidos

Sprint 1 (Release v0.1) · del 22/10/2026 al 12/11/2026 · Entregado el 05/11/2026

Integrantes

Javier Miñán Molina

Germán Delgado Fernández

Ana Meca Cano

Jaime Montávez Ruiz

Álvaro Sanabria Díaz

Juan Luis Jiménez Urbano

Universidad de Granada · Curso 2026-2027

ÍNDICE

Los números indican la página dentro de este PDF.


1. Diagrama de Gantt 3

2. Diagrama PERT (actividades en los arcos) 5

1. Diagrama de Gantt

Parte 1 de 2 · Diseño, infraestructura, HU-01, HU-02 y HU-03

Clave	Tarea	Tipo	Resp.	Dur.	Inicio	Fin
SCRUM-167 · Boceto interactivo en Justinmind						
168	Aprender Justinmind y configurar entorno	D	Ana	2 d	22/10	23/10
167	Boceto interactivo de todas las HU del sprint	D	Ana	4 d	24/10	27/10
HUT-01 · Backend e infraestructura Supabase + Vercel (SCRUM-154)						
155	Proyecto Supabase y despliegue en Vercel	I	Juanlu	3 d	22/10	24/10
156	Esquema SQL y políticas RLS	I	Germán	3 d	25/10	27/10
157	Variables .env, API keys y Supabase Auth	I	Juanlu	3 d	25/10	27/10
PRU-01	Pruebas de conexión a Supabase y de políticas RLS	P	Álvaro	1 d	28/10	28/10
HUT-02 · Pipeline CI/CD y calidad de código (SCRUM-158)						
159	GitHub Actions: build + tests unitarios	I	Javi	3 d	22/10	24/10
160	ESLint, Prettier y reglas a11y	I	Germán	3 d	22/10	24/10
161	Despliegue continuo en staging	I	Javi	2 d	25/10	26/10
PRU-02	Verificación del pipeline CI/CD con un PR de prueba	P	Germán	1 d	28/10	28/10
HUT-03 · Arquitectura Native y componentes accesibles (SCRUM-162)						
163	Setup app Native, router y estado global	I	Jaime	3 d	22/10	24/10
164	Design System accesible (tokens, contraste)	I	Álvaro	3 d	25/10	27/10
165	Servicio de sonidos y síntesis de voz	I	Jaime	3 d	25/10	27/10
PRU-03	Pruebas del Design System y de la voz en tableta	P	Ana	1 d	28/10	28/10
HU-01 · Login accesible con foto o pictograma (SCRUM-49)						
50	Cuadrícula táctil con fotos ≥120×120 px	I	Álvaro	3 d	29/10	31/10
51	Endpoint login visual sin contraseña	I	Jaime	3 d	29/10	31/10
52	Feedback sonoro y modo tableta personal	I	Ana	3 d	01/11	03/11
53	Pruebas de usabilidad con no lectores	P	Javi	2 d	06/11	07/11
HU-02 · Login estándar supervisores (Golden Story) (SCRUM-54)						
56	JWT, bcrypt y roles RBAC	I	Juanlu	3 d	29/10	31/10
55	Formulario login tutores/admin	I	Juanlu	3 d	01/11	03/11
57	Pruebas de expiración y seguridad	P	Javi	2 d	04/11	05/11
HU-03 · Perfiles y vinculación de tutores (SCRUM-58)						
59	Esquema alumnos, tutores y familias	I	Germán	2 d	29/10	30/10
60	API CRUD alumnos con fotos	I	Germán	2 d	31/10	01/11
62	Permisos escolar / doméstico (RGPD)	I	Germán	2 d	04/11	05/11
61	Consola admin de asignación de tutores	I	Germán	3 d	06/11	08/11
PRU-04	Pruebas de perfiles, vinculación y permisos	P	Javi	1 d	10/11	10/11

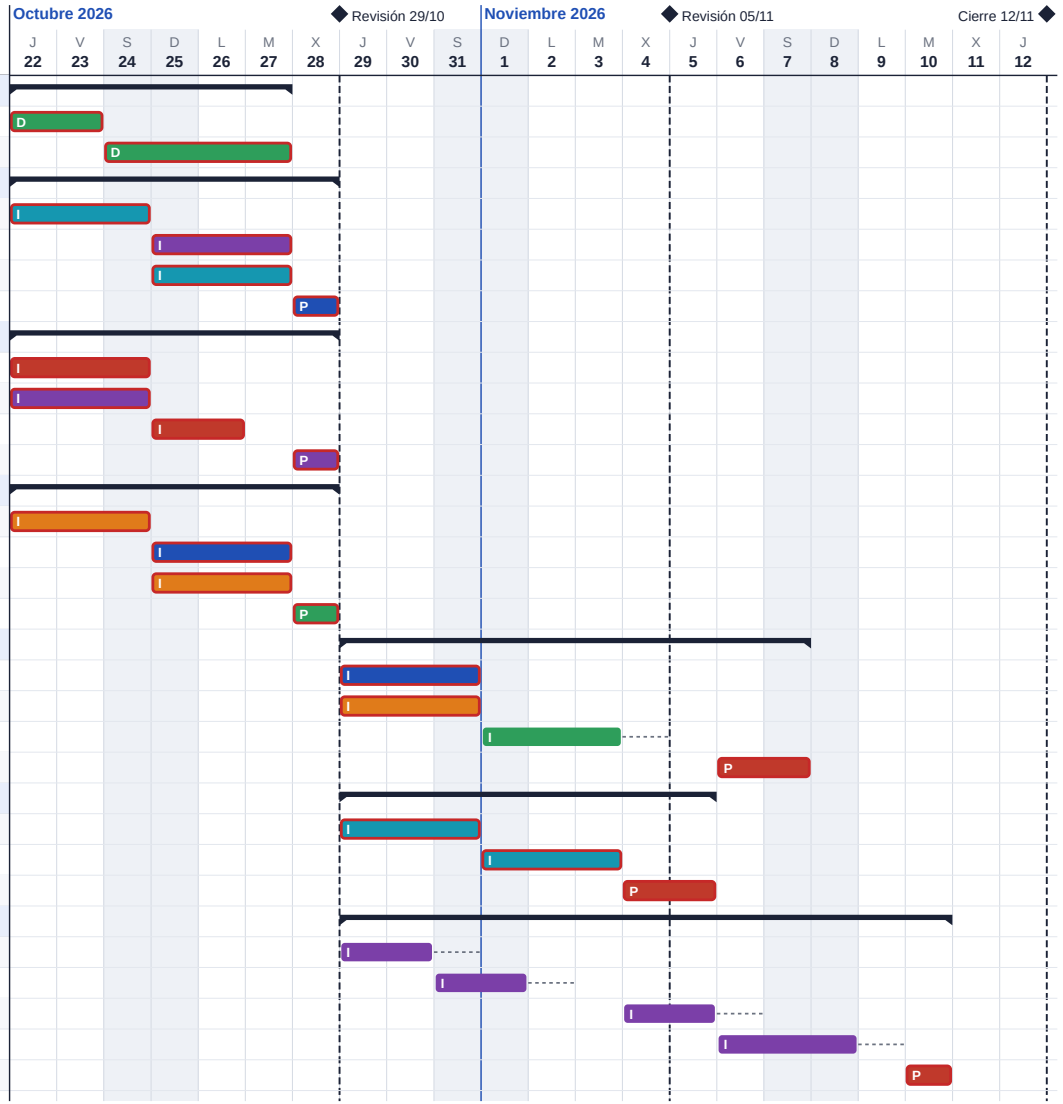


Álvaro Sanabria Díaz · Germán Delgado Fernández · Jaime Montávez Ruiz · Javier Miñán Molina · Ana Meca Cano · Juan Luis Jiménez Urbano · Tarea crítica · Holgura

◆ Revisión en clase · D Diseño · I Implementación · P Pruebas · G Gestión / documentación

1. Diagrama de Gantt · Parte 2 de 2 · HU-04 a HU-18 y documentación

Clave	Tarea	Tipo	Resp.	Dur.	Inicio	Fin
HU-04 · Personalización estética (ARASAAC) (SCRUM-63)						
65	Catálogo ARASAAC y consumo de API	I	Álvaro	2 d	01/11	02/11
64	Temas: alto contraste y pastel	I	Álvaro	2 d	03/11	04/11
66	Panel de preferencias (botón, tipografía)	I	Álvaro	2 d	05/11	06/11
67	Auditoría de contraste WCAG 2.1	P	Javi	2 d	08/11	09/11
HU-06 · Agenda del día (Hecho · Ahora · Después) (SCRUM-68)						
69	Componente 3 bloques (Ahora 60%)	I	Ana	2 d	29/10	30/10
71	Endpoint secuencia de tareas del día	I	Jaime	3 d	03/11	05/11
70	Avance automático al confirmar	I	Ana	2 d	06/11	07/11
72	Sin scroll ni distracciones	I	Ana	2 d	08/11	09/11
PRU-05	Pruebas de la agenda del día (secuencia y avance)	P	Germán	2 d	10/11	11/11
HU-08 · Confirmación de inicio y fin de tarea (SCRUM-73)						
74	Botones EMPEZAR / TERMINAR gigantes	I	Javi	2 d	31/10	01/11
76	Registro de marcas de tiempo	I	Germán	2 d	02/11	03/11
75	Anti toques accidentales (1,5 s)	I	Ana	2 d	04/11	05/11
PRU-06	Pruebas de confirmación de inicio/fin y anti toques	P	Jaime	1 d	10/11	10/11
HU-09 · Time Timer visual (SCRUM-77)						
78	Disco regresivo SVG	I	Jaime	2 d	01/11	02/11
79	Rótulo de tiempo en lectura fácil	I	Jaime	2 d	06/11	07/11
80	Alarma suave de fin de tiempo	I	Jaime	2 d	08/11	09/11
PRU-07	Pruebas del Time Timer (precisión y alarma)	P	Juanlu	1 d	11/11	11/11
HU-16 · Aviso anticipatorio de cambio (SCRUM-81)						
82	Evento 5 min antes de la tarea	I	Juanlu	2 d	07/11	08/11
83	Pop-up con pictograma y vibración	I	Juanlu	2 d	09/11	10/11
84	Test de disparo con cambios de reloj	P	Ana	2 d	11/11	12/11
HU-18 · Botón de necesidades básicas (SCRUM-85)						
88	Alerta al tutor con Supabase Realtime	I	Juanlu	3 d	04/11	06/11
86	Botón flotante en todas las pantallas	I	Álvaro	2 d	07/11	08/11
87	Modal Baño · Agua · Descanso	I	Álvaro	2 d	09/11	10/11
PRU-08	Pruebas del botón de necesidades y la alerta	P	Jaime	2 d	11/11	12/11
DOC · Documentación y gestión del sprint						
170	Plantilla y guía del Informe de Accesibilidad	G	Álvaro	3 d	22/10	24/10
169	Guía del Informe de Calidad	G	Javi	2 d	27/10	28/10
171	Revisión general del Sprint 1	G	Javi	1 d	11/11	11/11
173	Rellenar informe de accesibilidad	G	Álvaro	2 d	11/11	12/11
172	Rellenar informe de calidad	G	Javi	1 d	12/11	12/11

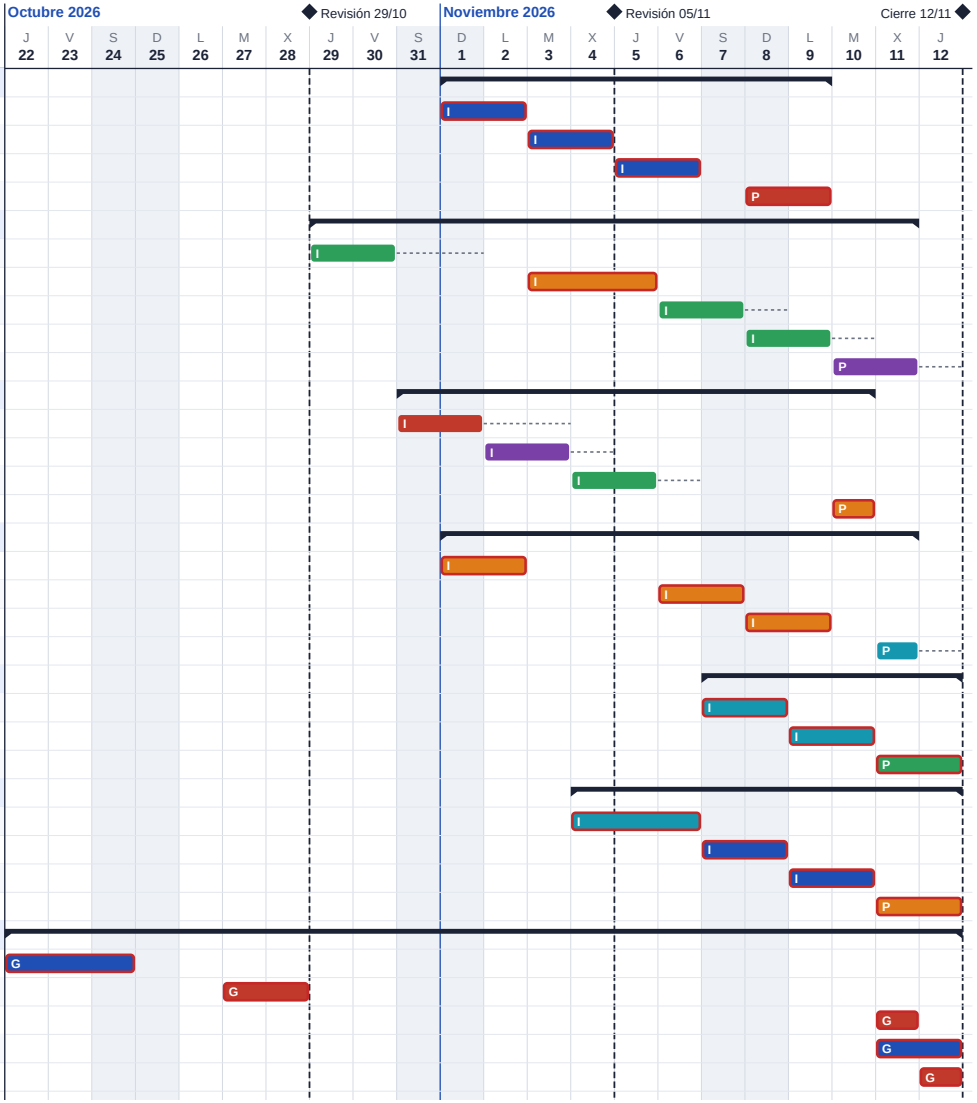

Álvaro Sanabria Díaz · Germán Delgado Fernández · Jaime Montávez Ruiz · Javier Miñán Molina · Ana Meca Cano · Juan Luis Jiménez Urbano · Tarea crítica · Holgura

◆ Revisión en clase · D Diseño · I Implementación · P Pruebas · G Gestión / documentación

2. Diagrama PERT (actividades en los arcos)

Parte 1 de 2 · Fase 1: del 22/10 a la revisión del 29/10 (suceso 14). Eje horizontal a escala de tiempo; cada franja es una persona.



Suceso: número · TE (tiempo más temprano) · TL (tiempo más tardío), en días desde el 22/10.


52 I — 3 d

Actividad: clave (sin «SCRUM-»), tipo y duración. Las flechas rojas son el camino crítico.

Ficticia (duración 0): solo indica precedencia.

Tramo punteado: **espera** hasta el suceso final (holgura).

2. Diagrama PERT · Parte 2 de 2 · Fase 2: del 29/10 (suceso 14) al cierre del sprint el 12/11 (suceso 59).

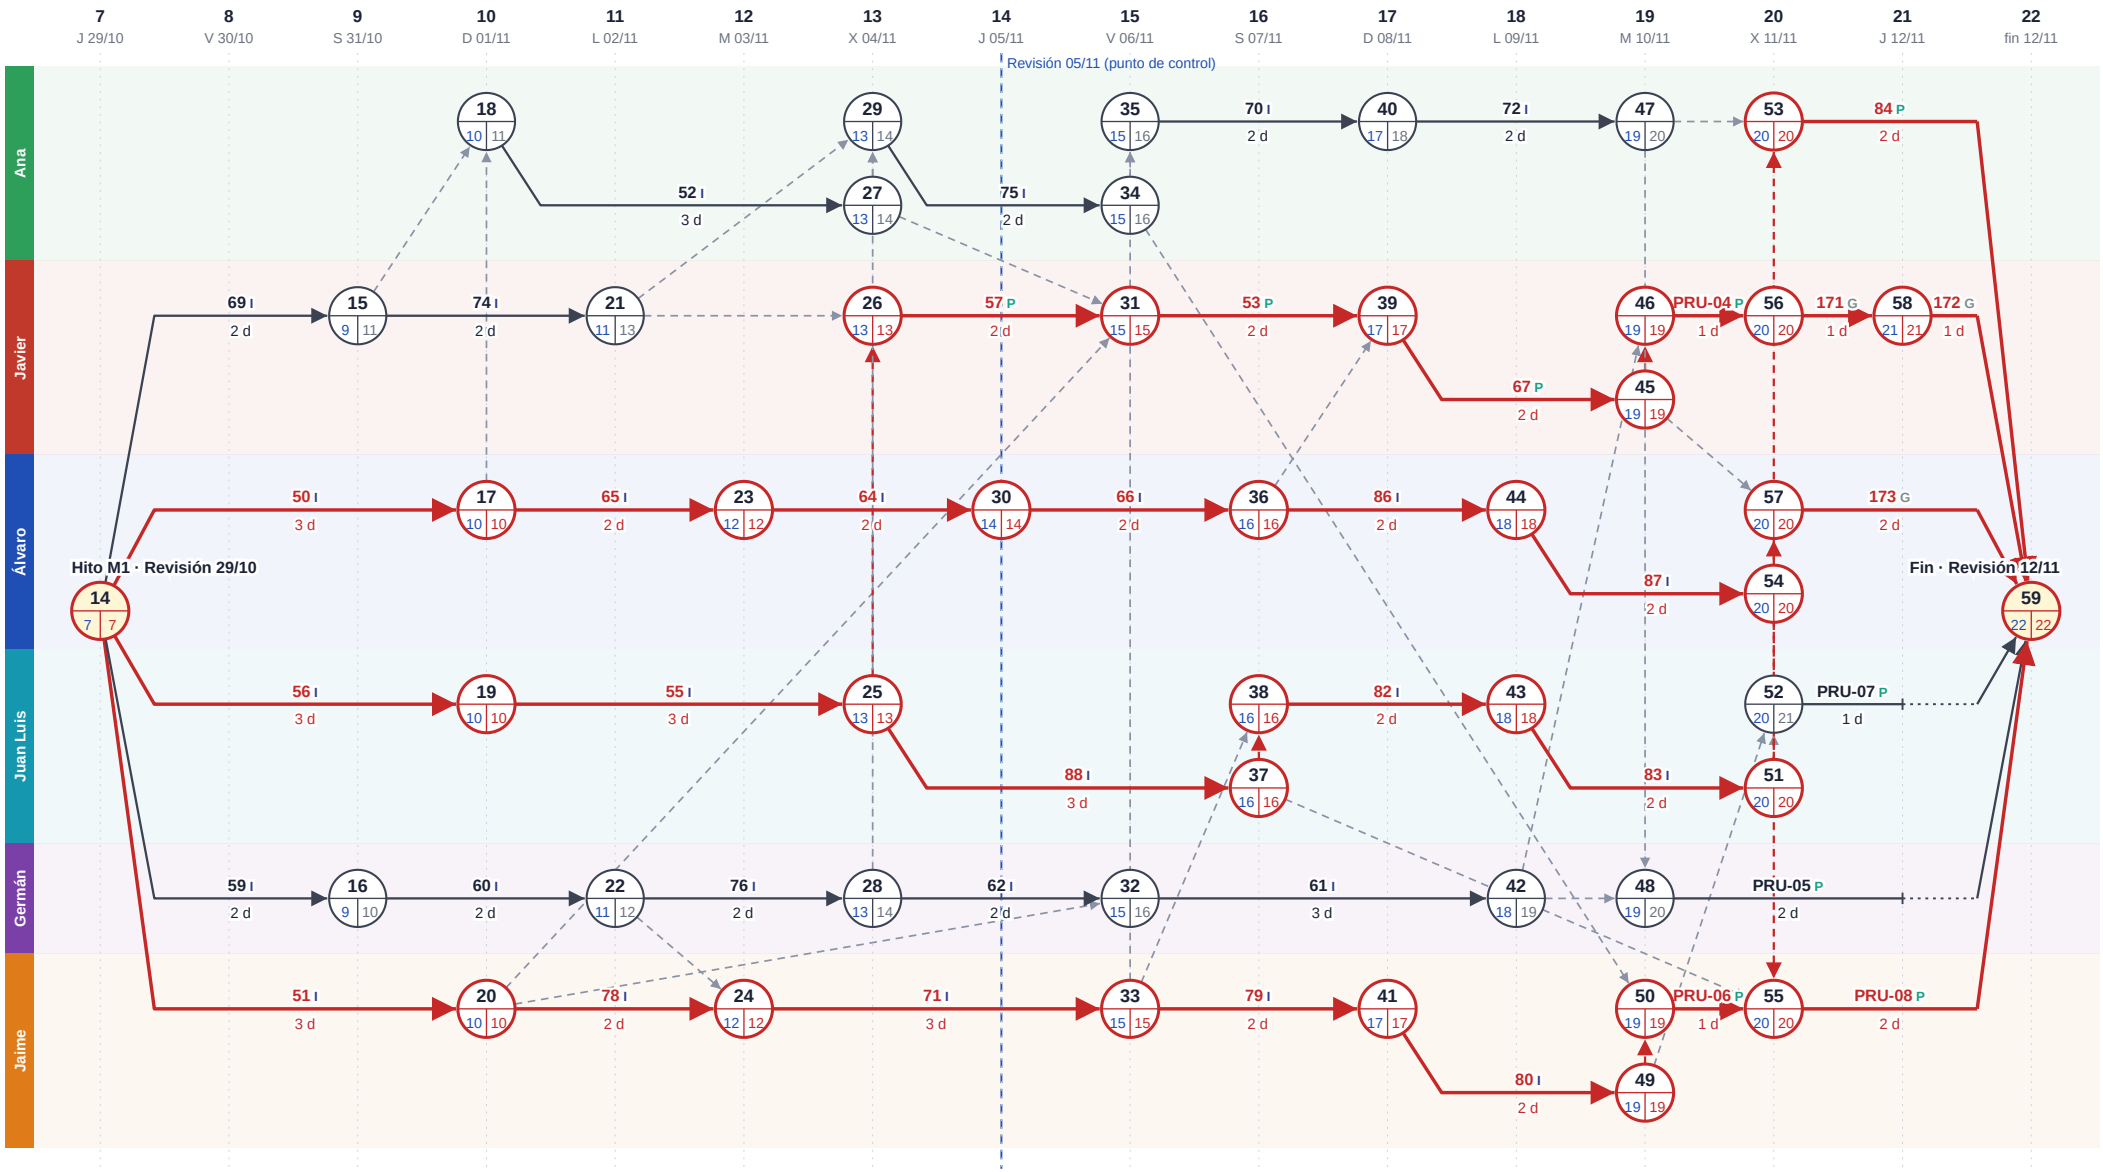

Suceso: número · TE (tiempo más temprano) · TL (tiempo más tardío), en días desde el 22/10.

Actividad: clave (sin «SCRUM-»), tipo y duración. Las flechas rojas son el camino crítico.

Ficticia (duración 0): solo indica precedencia.

Tramo punteado: **espera** hasta el suceso final (holgura).
